



新校舎「白雲館」完成までの建設レポート⑦

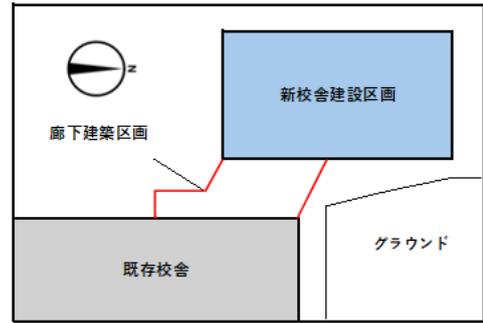

白雲館建設工事 略図

前回の「建設レポート⑥」でご報告させていただいた、新校舎建築区画における地中梁の形成が完了し、「基礎足場」の撤去作業が行われました。

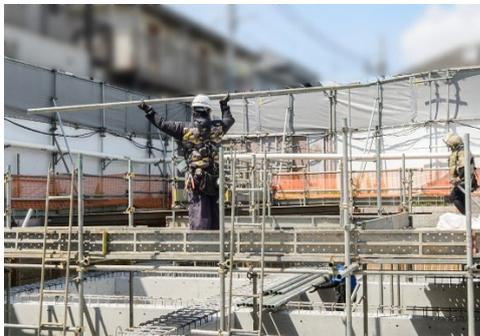

基礎足場を撤去する様子①



基礎足場を撤去する様子②

次に、基礎工事の際に掘り起こした、おおよそ5立方メートルの土を埋め戻し、災害時の液状化現象を防ぐために「転圧」作業を行い地盤の強化を図りました。



土の埋め戻し



転圧作業

また、廊下建築区画も同様に、「地中梁」の施工が完了し、全区画における基礎工事が終了いたしました。



鉄筋が組まれる様子



コンクリートが流し込まれる様子




新校舎建築区画 現在の様子



廊下建築区画 現在の様子

現在は、作業の場所を既存校舎に移し、新設する廊下と接続する部分の外壁解体工事を行っております。

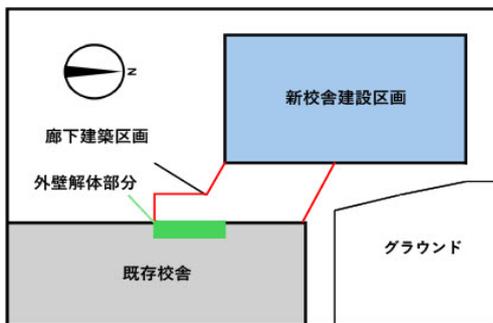

白雲館建設工事 略図



解体作業の様子①



解体作業の様子②



解体作業の様子③

この解体作業が終わりますと、周辺の整地作業等の準備を行った後に、いよいよ地上部分の建築作業に入ります。引き続き、安全に配慮した上で進めてまいります。また進捗がありましたら、ご報告させていただきます。
